


GAL

marmilla



Prima rimodulazione PSL Gal Marmilla

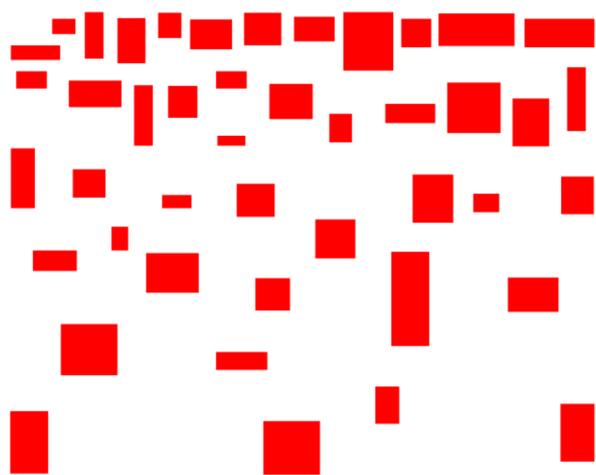



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Sommario

Premessa	3
Misura 311 Azione 1-2-3-4-5-6 - Privati	3
Stato del procedimento	3
Motivazioni rimodulazione	4
Indicatori	5
Misura 312	7
Stato del procedimento	7
Motivazioni rimodulazione	7
Indicatori	7
Misura 313	8
Stato del procedimento	8
Motivazioni rimodulazione	8
Indicatori	8
Allegati	
Quadro finanziario originario	9
Quadro finanziario rimodulato	10

PREMESSA

Il presente documento e i relativi allegati sono susseguenti alle direttive impartite dalle note n.1182(22.01.2013), n.2234(06.02.2013), n.2458(08.02.2013) e n.2620(12.02.2013) emanate dalla direzione del Servizio di Sviluppo Locale, nel soddisfacimento delle quali, questo GAL ha individuato le modifiche da apportare al quadro economico finanziario del PSL, denominato M.A.S.S.A.I.U.

Le modifiche apportate individuano, come determinanti, per l'attuazione della strategia descritta nel PSL le Misure e le Azioni di cui alla Misura 313, 321, 322, 323, 413, 421 e 431, per cui non si apporteranno variazioni, ovvero riduzioni alle suddette azioni e misure, nella certezza di ottemperare ai criteri stabiliti dal suddetto piano.

La necessità di impegnare con la massima urgenza le somme a disposizione è un criterio, tra gli altri che saranno descritti, che ha guidato le scelte di rimodulazione e riduzione. Di certo, sarà chiarito che le riduzioni assegnate non modificano la strategia sottesa dal PSL nel suo obiettivo generale e nei singoli obiettivi specifici/operativi, ne sottendono alla modifica sostanziale degli indicatori di risultato corrispondenti.

La presente rimodulazione è stata approvata in bozza con delibera del Consiglio di Amministrazione n.02 del 20.02.2013 e, nella stesura definitiva, con delibera dell'assemblea dei soci n.02 del 13 marzo 2013.

Le modifiche apportate soddisfano le direttive di cui alla Decisione della Commissione Europea UE C(2012) del 26.11.2012, giusta nota della direzione del Servizio di Sviluppo Rurale n.17622 del 13.09.2012, dalla quale si evince una riduzione delle somme per l'attuazione del PSL pari ad **euro 719.277,00**.

Dall'analisi dei dati e delle considerazioni espone a giustificazione delle modifiche apportate, si potranno comprendere criticità, stato di attuazione e di previsione della spesa.

MISURA 311

STATO DEL PROCEDIMENTO.

La procedura relativa al 1° e unico bando di accesso ai finanziamenti di cui alla Misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sta giungendo a conclusione, almeno per quanto riguarda l'impegno delle somme ritenute ammissibili.

MISURA 311									
MISURA	AZIONE	BUDGET	BUDGET RIMODULATO	DIFFERENZE	DOMANDE FINANZIABILI	PROGETTI FINANZIATI	IMPORTO CONCESSO	RESIDUO BANDO 2011	PREVISIONI BANDO 2013*
311	1	1060000,00	1000000,00	60000,00	17	9	675208,50	384791,50	324791,50
	2	500000,00	450000,00	50000,00	12	7	251148,76	248851,24	198851,24
	3	850000,00	750000,00	100000,00	15	6	368268,98	471831,02	371831,02
	4	380000,00	160000,00	220000,00	5	1	40000,00	340000,00	120000,00
	5	300000,00	300000,00	0,00	8	4	143172,49	156827,51	156827,51
	6	1020000,00	670723,00	349277,00	61	27	393446,62	626553,38	277276,38
		4.110.000,00	3.330.723,00		118	54	1.871.245,35	2.228.854,65	1.449.577,65
									-779.277,00

Complessivamente sono state decretate risorse pari a 1.871.245,35 euro e cioè il 47,53% del budget disponibile a bando.

Delle risorse risultate disponibili dal 1° bando si prevede di utilizzarne per il bando 2013, di prossima pubblicazione, il 65,04% del totale, pari a 1.449.577,65 euro

Ciò che appare evidente dalla tabella a lato, sintesi del procedimento alla Misura collegato, è la forte differenza, in riduzione, tra il numero di domande ritenute ammissibili e il numero dei beneficiari per i quali si è pervenuti all'istruttoria positiva dei progetti (45,76%).

Tale differenza sarebbe potuta essere molto più marcata se non si fosse adoperato il criterio di condurre, da parte del team d'istruttori i progetti pervenuti, un rapporto costruttivo con i tecnici incaricati della predisposizione delle rispettive pratiche, per limare imprecisioni e incongruenze. Ciò ha comportato un

dilatamento dei tempi di istruttoria, ma ha consentito che le pratiche escluse per carenze progettuali o per indicazioni di spesa non ammissibili siano solo due. C'è inoltre da rimarcare che l'animazione territoriale svolta durante il periodo di pubblicazione del bando e gli incontri informativi con i tecnici per la predisposizione dei progetti, svolta capillarmente sul territorio, ha contribuito al risultato ottenuto.

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

Se si analizzano la graduatoria provvisoria e quella definitiva, di cui alla Misura 311, sono chiari o almeno facilmente desumibili i motivi che conducono a una riduzione calcolata del budget iniziale, pari a 4.110.000 euro, previsto nella stesura definitiva del PSL. Si cercherà di sintetizzarne gli aspetti più rilevanti e di facile condivisione:

1. **Tutte le azioni: La crisi economica e finanziaria** – Il disagio dell'economia e la relativa recessione che attanaglia da ormai quattro anni il territorio nazionale, si concreta ancor più in territori svantaggiati come quello della Marmilla. Sono noti i dati attuali sullo spopolamento, che ha raggiunto, nel territorio di riferimento, valori tra i più alti del territorio regionale. La congiuntura economica è fattore decisivo per gli investimenti in azienda e nella situazione attuale li scoraggia. Tale situazione è evidente dalla lettura della graduatoria definitiva che ha visto il non proseguimento dell'iter istruttorio di ventidue domande ritenute ammissibili in prima richiesta, nelle azioni 1, 2, 3, 4 e 5. *Tale criticità non si ritiene superabile nel 2° bando di prossima pubblicazione.*
2. **Tutte le azioni: I titoli di possesso** – La pratica ancora attuale, nel territorio della Marmilla, di pervenire alla proprietà/possesso di un fondo agrario e dei fabbricati a essi connessi attraverso processi non conformi alla norma, non facilita il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità previsti dai manuali dei controlli e d'istruttoria dei progetti di cui alla Misura 311. Tale criticità è evidente dalla lettura della graduatoria definitiva che esclude più di venti domande ritenute ammissibili in prima richiesta, anche in quelle azioni che avevano dimostrato una buona "appetibilità". *Tale criticità non si ritiene superabile nel 2° bando di prossima pubblicazione.*
3. **L'azione 4: Il turismo equestre** – E' certo che le previsioni iniziali del PSL, che intervenivano con un budget di 380.000,00 euro per il potenziamento dei servizi turistici di tipo equestre, mostravano correttamente un'attenzione particolare alla piattaforma fisica che definisce la Marmilla, contraddistinta da una serie di rilievi tabulari di rilevante interesse naturalistico e da un paesaggio "dolce" facilmente percorribili a cavallo. Se a ciò si aggiunge la presenza nel territorio di una stazione d'incremento ippico, di numerose associazioni e soprattutto della Giara di Gesturi si sarebbe dovuto assistere a una richiesta forte d'interventi nel settore. Ciò non è avvenuto, soprattutto per la particolarità del settore e del modello economico a esso connesso che, meno degli altri si auto finanzia, come si evince dalla letteratura collegata. La motivazione del "fallimento" dell'azione è dunque sostanzialmente di tipo economico congiunturale e si presume che *tale criticità non si ritiene superabile nel 2° bando di prossima pubblicazione.*
4. **L'azione 6: Le energie rinnovabili** – Il successo ottenuto sull'azione 6 della relativa Misura, in sede di prima istanza, è stato drasticamente ridimensionato a seguito del decreto ministeriale per l'accesso agli incentivi per l'energia prodotta da fonte solare o eolica, conosciuto come *V conto energia*, che di fatto ha determinato una diminuzione dell'impegno delle somme di circa il 70% (vedi decreti di finanziamento), con una "mortalità" delle domande ammissibili pari a 52. Le direttive ministeriali emanate hanno previsto una riduzione degli incentivi per la vendita dell'energia prodotta da fonte solare, favorendo l'auto consumo, non finanziabile con la suddetta azione. A tale limite normativo, intervengono criticità legate alla particolare realtà paesaggistica del territorio della Marmilla racchiuso tra le aree di rilevante interesse paesaggistico del M. Arci, Giara di Siddi e di Gesturi, e la normativa paesaggistica, di provenienza ministeriale, soprattutto per il regime di autorizzazione all'eolico. *Tale criticità non si ritiene superabile nel 2° bando di prossima pubblicazione, anzi, le risorse stabilite a budget (€277.276,38), da analisi preliminari svolte sul territorio, è ipotizzabile che siano superiori alle attese da parte degli ipotetici beneficiari.*

INDICATORI.

La riduzione del budget iniziale della Misura 311 per un valore di 779.277,00 euro pari al 18,96% del totale di 4.110.000,00, non interviene in maniera sostanziale né sugli indicatori di prodotto, né sugli indicatori di risultato, per cui non influisce negativamente sull'**obiettivo 1- rafforzamento del settore produttivo.**

I motivi derivano

per quanto riguardano **gli indicatori comuni di prodotto** da due distinti fattori:

1. La diversa percentuale di cofinanziamento richiesta per l'azione 6 che, a fronte di risorse concesse pari a circa 400.000,00 euro, ha visto un investimento complessivo da parte dei beneficiari pari a 1.400.000,00 euro. La situazione si è ripetuta, per taluni casi, nelle azioni 1 e 3, incrementando il volume totale degli investimenti previsto inizialmente. Se le condizioni si ripetessero nel bando 2013, il volume totale dell'investimento sarebbe di certo non inferiore a 7.500.000,00 euro.
2. Il fatto che già con il 1° bando i progetti finanziabili siano in numero di 54, è condivisibile ipotizzare che con il bando 2013, avente un budget pari a circa 1.450.000,00 si possa raggiungere il numero di 72 beneficiari. Il contributo massimo assegnato per singola azione, nel bando 2013 di prossima pubblicazione, dovrebbe individuare almeno 22 nuovi beneficiari, superando il valore dell'ICP.

per quanto riguarda **gli indicatori comuni di risultato** da tre distinti fattori:

1. Gli introiti provenienti in azienda con l'azione 6 fanno presagire anche il mantenimento della soglia stabilita per quanto riguarda l'aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola.
2. Se il dato di un milione di euro per unità lavorativa rimane valido, nonostante il peggioramento della situazione finanziaria mondiale, anche il dato sul n. lordo di posti di lavoro creati dovrebbe rimanere inalterato.
3. Considerazioni differenti sono invece da farsi circa il riferimento al n. di turisti in più in azienda. E' nota la contrazione del settore sia sul territorio nazionale, sia in Sardegna, con riflessi anche in aree marginali come la Marmilla. Il dato però subisce non solo le dinamiche economiche, ovvero la contrazione seppur marginale dell'indicatore comune di prodotto relativo al volume totale degli investimenti, ma dalla ricerca condotta in questi venti mesi di attività, è chiara la debolezza delle aziende ad intercettare i flussi presenti nel territorio derivanti soprattutto dalla visita al sito nuragico di Barumini che nel 2012 ha visto la presenza di circa 90.000 visitatori, con un incremento rispetto al 2011 del 11,25%. Il dato individuato ex ante nel PSL del Gal Marmilla, potrà essere mantenuto e migliorato se le azioni di sistema e i progetti a beneficio degli enti locali avranno una matrice territoriale univoca.

Di seguito sono riprese le considerazioni adoperate per la stima degli indicatori di prodotto, risultato e impatto del PSL, basate essenzialmente sulla applicazione del percorso logico e sulle fonti informative proposte dal valutatore nel rapporto di valutazione ex ante, con riferimento alla dotazione finanziaria decisa per questo programma di sviluppo.

PSL – valutazione EX ANTE

MISURA 311	Indicatore	Target
Diversificazione verso attività non agricole		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	72
	Volume totale degli investimenti	7.886.666,67
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	701.045
	Numero lordo di posti di lavoro creati	7,5
	Numero di turisti in più	2161/anno

PSL RIMODULATO – valutazione EX ANTE

MISURA 311	Indicatore	Target
Diversificazione verso attività non agricole		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	76
	Volume totale degli investimenti.	7.500.000,00
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie.	701.045
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	7,5
	Numero di turisti in più.	2161/anno

MISURA 312

STATO DEL PROCEDIMENTO.

La procedura relativa al 1° e 2° bando di accesso ai finanziamenti di cui alla Misura 312 azioni 1, 2 e 3, sta giungendo a conclusione, almeno per quanto riguarda l'impegno delle somme ritenute ammissibili riferite al 1° bando, mentre si è in attesa delle proposte progettuali per quanto riguarda il 2° bando, la cui scadenza è stabilita intorno al 15 aprile.

MISURA	AZIONE	BUDGET	BUGET RIMODULATO	DOMANDE FINANZIABILI	PROGETTI FINANZIABILI	IMPORTO CONCESSO BANDI 2011 E 2012	RESIDUO BANDO 2011	RESIDUO BANDO 2012	DIFFERENZE
312	1	462.500,00	409.000,00	18	14	408.500,00	160.000,00	53.500,00	-53.500,00
	2	343.319,00	313.699,20	9	8	313.699,20	258.319,00	29.619,80	-29.619,80
	3	312.500,00	348.050,00	20	20	348.550,00	204.100,00	-35.550,00	35.550,00
		1.118.319,00	1.070.749,20	47	42	1.070.749,20	622.419,00	47.569,80	-47.569,80
								-47.569,80	47.569,80

I dati finanziari acquisiti dunque, risultano, rispetto alla misura 311, abbastanza approssimativi e soggetti di certo a variazioni in sede di ammissibilità definitiva delle richieste risultate idonee. Il dato del 1° bando ha comunque rilevato un risultato mediocre con un impegno delle risorse pari al 44,34% del totale di 1.118.319,00 euro disponibili. La decisa animazione territoriale in sede di pubblicazione del 2° bando, ha invece prodotto risultati lusinghieri e le graduatorie provvisorie hanno determinato pochi residui, pari a 47.569,80 euro.

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

La necessità di pervenire all'impegno di tutte le risorse entro il corrente anno, e le numerose attività che ne conseguono in capo alla struttura tecnica del GAL Marmilla, ha contribuito di certo a considerare valida l'ipotesi di modifica della Misura 312 in riduzione rispetto al budget definito con l'originario PSL. Non avrebbe giusto valore attivare la procedura per la pubblicazione di un nuovo bando 2013 per risorse a disposizione così irrisorie.

INDICATORI.

La riduzione del budget iniziale della Misura 312 per un valore di 47.569,80 euro pari al 4,25% del totale di 1.118.319,00, non interviene in alcuna maniera sostanziale né sugli indicatori di prodotto, né sugli indicatori di risultato, seppur modificandoli numericamente, per cui non influisce negativamente sull'**obiettivo 1- rafforzamento del settore produttivo**. Di seguito sono riprese le considerazioni adoperate per la stima degli indicatori di prodotto, risultato e impatto del PSL, basate essenzialmente sulla applicazione del percorso logico e sulle fonti informative proposte dal valutatore nel rapporto di valutazione ex ante, con riferimento alla dotazione finanziaria decisa per questo programma di sviluppo.

PSL – valutazione EX ANTE

MISURA 312 - Micro imprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	33
	Volume totale degli investimenti	2.236.638
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	292.349
	Numero lordo di posti di lavoro creati	5,64

PSL RIMODULATO – valutazione EX ANTE

MISURA 312 - Micro imprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	42
	Volume totale degli investimenti.	2.141.499
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie.	292.349
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	5,64

MISURA 313

STATO DEL PROCEDIMENTO.

La procedura relativa al 1° bando di accesso ai finanziamenti di cui alla Misura 313, che ha riguardato solo l'azione 4, sta giungendo a conclusione, almeno per quanto riguarda l'impegno delle somme ritenute ammissibili e si perverrà ai decreti entro la fine di Aprile.

MISURA	AZIONE	BUDGET	DOMANDE FINANZIABILI	PROGETTI FINANZIABILI	IMPORTO CONCESSO BANDI 2011	RESIDUO BANDO 2011
313	4	861.000,00	33	25	968.569,80	-107.569,80
		861.000,00	33	25	968.569,80	-107.569,80
		968.569,80				107.569,80

I dati finanziari acquisiti dunque, risultano certi e non soggetti a variazioni in sede di impegno finanziario delle richieste risultate idonee. Il dato del 1° bando ha comunque

rilevato un ottimo risultato, come prevedibile, con un impegno iniziale delle risorse pari al 140,76% del totale di 861.000,00 euro disponibili.

L'istruttoria dei progetti in fase finale di ammissibilità ha determinato inoltre l'esclusione di n.8 domande sia per l'assenza del requisito della residenza, sia per il possesso giuridico dell'immobile. Per il soddisfacimento di tutte le istanze ritenute valide risultano necessarie ulteriori risorse, rispetto al budget iniziale di 861.000,00 euro, pari a 107.569,80 (12,49%).

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

La necessità di soddisfare tutte le istanze ritenute valide nell'azione 4, ha convalidato la modifica dell'azione 4 della Misura 313, in aumento rispetto al budget definito con l'originario PSL.

INDICATORI.

L'aumento del budget iniziale dell'azione 4 della Misura 313 per un valore di 107.569,80 euro pari al 12,49% del totale di 861.000,00 euro e la definita riduzione dell'investimento complessivo per le azioni 1 e 2 a vantaggio degli enti pubblici, che dovranno però assicurare un cofinanziamento minimo del 10%, interviene in maniera positiva sugli indicatori di prodotto e di risultato.

PSL – valutazione EX ANTE

MISURA 313 – Attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	41
	Volume totale degli investimenti	3.222.000
Indicatore comune di Risultato	Numero di turisti in più	2.340
	Numero lordo di posti di lavoro creati	1

PSL RIMODULATO – valutazione EX ANTE

MISURA 313 – Attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	83
	Volume totale degli investimenti.	3.312.140
Indicatore comune di Risultato	Numero di turisti in più	2.340
	Numero lordo di posti di lavoro creati	1

ALLEGATI

QUADRO FINANZIARIO ORIGINARIO.

Misura		SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE INVESTIMENTO
		Stato + Ras (56% spesa pubblica)	FEASR (44% spesa pubblica)	TOTALE PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€	€
	1	593.600,00	466.400,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00
	2	280.000,00	220.000,00	500.000,00	166.666,67	666.666,67
	3	476.000,00	374.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
	4	212.800,00	167.200,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00
	5	168.000,00	132.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	6	571.200,00	448.800,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00
totale misura 311		2.301.600,00	1.808.400,00	4.110.000,00	3.776.666,67	7.886.666,67
312	Azione	€	€	€	€	€
	1	259.000,00	203.500,00	462.500,00	462.500,00	925.000,00
	2	192.258,64	151.060,36	343.319,00	343.319,00	686.638,00
	3	175.000,00	137.500,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00
totale misura 312		626.258,64	492.060,36	1.118.319,00	1.118.319,00	2.236.638,00
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	3	168.000,00	132.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00
	4	482.160,00	378.840,00	861.000,00	861.000,00	1.722.000,00
totale misura 313		1.154.160,00	906.840,00	2.061.000,00	1.161.000,00	3.222.000,00
TOTALE OBIETTIVO 3.1		4.082.018,64	3.207.300,36	7.289.319,00	6.055.985,67	13.345.304,67
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	168.000,00	132.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	2	504.000,00	396.000,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
	3	336.000,00	264.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
totale misura 321		1.008.000,00	792.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	369.600,00	290.400,00	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00
	2	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	666.666,67	1.666.666,67
totale misura 322		929.600,00	730.400,00	1.660.000,00	1.106.666,67	2.766.666,67
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	532.000,00	418.000,00	950.000,00	291.666,67	1.241.666,67
	3	580.720,00	456.280,00	1.037.000,00	300.916,67	1.337.916,67
totale misura 323		1.112.720,00	874.280,00	1.987.000,00	592.583,34	2.579.583,34
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.050.320,00	2.396.680,00	5.447.000,00	2.899.250,01	8.346.250,01
TOTALE OBIETTIVI		7.132.338,64	5.603.980,36	12.736.319,00	8.955.235,68	21.691.554,68
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	280.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2	364.000,00	286.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
totale misura 413		644.000,00	506.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
TOTALE STRATEGIA		7.776.338,64	6.109.980,36	13.886.319,00	8.955.235,68	22.841.554,68
431	Azione	€	€	€	€	€
	431 a	677.824,00	532.576,00	1.210.400,00	0,00	1.210.400,00
	431 b	395.320,80	310.609,20	705.930,00	0,00	705.930,00
totale misura 431		1.073.144,80	843.185,20	1.916.330,00	0,00	1.916.330,00
TOTALE GAL		8.849.483,44	6.953.165,56	15.802.649,00	8.955.235,68	24.757.884,68



QUADRO FINANZIARIO RIMODULATO.

Misura		SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE INVESTIMENTO
		Stato + Ras (56% spesa pubblica)	FEASR (44% spesa pubblica)	TOTALE PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€	€
	1	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00
	3	420.000,00	330.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	4	89.600,00	70.400,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	5	168.000,00	132.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	6	375.604,88	295.118,12	670.723,00	1.565.020,33	2.235.743,33
	totale misura 311	1.865.204,88	1.465.518,12	3.330.723,00	3.925.020,33	7.255.743,33
312	Azione	€	€	€	€	€
	1	229.040,00	179.960,00	409.000,00	409.000,00	818.000,00
	2	175.671,55	138.027,65	313.699,20	313.699,20	627.398,40
	3	194.908,00	153.042,00	348.050,00	348.050,00	696.100,00
	totale misura 312	599.619,55	471.029,65	1.070.749,20	1.070.749,20	2.141.498,40
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	3	168.000,00	132.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00
	4	542.399,10	426.170,70	968.569,80	968.569,80	1.937.139,60
	totale misura 313	1.214.399,10	954.170,70	2.168.569,80	1.268.569,80	3.437.139,60
	TOTALE OBIETTIVO 3.1	3.679.223,53	2.890.718,47	6.570.042,00	6.264.339,33	12.834.381,33
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	168.000,00	132.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	2	504.000,00	396.000,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
	3	336.000,00	264.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
	totale misura 321	1.008.000,00	792.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	369.600,00	290.400,00	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00
	2	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	666.666,67	1.666.666,67
	totale misura 322	929.600,00	730.400,00	1.660.000,00	1.106.666,67	2.766.666,67
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	532.000,00	418.000,00	950.000,00	291.666,67	1.241.666,67
	3	580.720,00	456.280,00	1.037.000,00	300.916,67	1.337.916,67
	totale misura 323	1.112.720,00	874.280,00	1.987.000,00	592.583,34	2.579.583,34
	TOTALE OBIETTIVO 3.2	3.050.320,00	2.396.680,00	5.447.000,00	2.899.250,01	8.346.250,01
	TOTALE OBIETTIVI	6.729.543,53	5.287.398,47	12.017.042,00	9.163.589,34	21.180.631,34
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	280.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2	364.000,00	286.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	totale misura 413	644.000,00	506.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	TOTALE STRATEGIA	7.373.543,53	5.793.398,47	13.167.042,00	9.163.589,34	22.330.631,34
Misura 431		€	€	€	€	€
		1.073.144,80	843.185,20	1.916.330,00	0,00	1.916.330,00
	TOTALE GAL	8.446.688,33	6.636.588,67	15.083.372,00	9.163.589,34	24.246.961,34



PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

	FEASR (44% su totale spesa pubblica)	TOTALE SPESA PUBBLICA	ANNUALITA'
Importo €	14.421,97	32.777,21	2009
Valore %	0,22%	0,22%	
Importo €	131.021,97	297.777,21	2010
Valore %	1,97%	1,97%	
Importo €	1.853.723,06	4.213.006,96	2011
Valore %	27,93%	27,93%	
Importo €	3.476.764,15	7.901.736,71	2012
Valore %	52,39%	52,39%	
Importo €	6.501.959,00	14.777.179,55	2013
Valore %	97,97%	97,97%	
Importo €	6.603.500,26	15.007.955,14	2014
Valore %	99,50%	99,50%	
Importo €	6.636.683,68	15.083.372,00	2015
Valore %	100,00%	100,00%	

La TABELLA indica la spesa pubblica complessiva e quella a partecipazione FEASR, in termini di avanzamento della spesa per ciascuna annualità, ai fini della determinazione della regola N+2
